



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telp. 024-7608368 Faks. 024-7613181
Website : <http://www.jatengprov.go.id> Email : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Semarang, 1 April 2024

Nomor : 000/693
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Undangan POK Bulan April 2024

Yth. Daftar Terlampir

di
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara rapat yang dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan April Tahun 2024
dengan **Tema "Persiapan Jalur Mudik Lebaran Tahun 2024"**
(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir Bulan Maret Thn 2024)

Catatan :
1. Materi rakor dapat dikirim ke Subbag Program melalui email programbm@gmail.com;
2. Para Kepala Balai hadir secara pribadi apabila berhalangan dapat mengikuti melalui Zoom Meeting sedangkan Kepala Balai Jakon dan Para Sub Koordinator mengikuti melalui Zoom Meeting dari Kantor Balai masing-masing.

ID : 831 8386 3078
Pass : 223445

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PU Bina Marga Dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

\$\\{ttd\\}

Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si
Pangkat

Tembusan:

1. Sekretaris Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Subbag Program;
3. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Subbag Keuangan.

Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Solo;
17. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Bawen.

NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG

Hari / Tanggal	: Rabu, 03 April 2024
Waktu	: Pukul 09.00 s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang
Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Hadir	:
1) Dinas PU BMCK	: Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
2) BPJ Wil. Bina Marga	: Para Kepala BPJ Wilayah
3) Balai Pengujian dan Peralatan	: Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
4) Balai Jasa Konstruksi	: Kepala Balai Jasa Konstruksi
5) Satker Bina Marga	: Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1, 2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
6) Satker Cipta Karya	: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
7) Satker Dinas PU BMCK Jateng	: Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
1	Kepala Dinas - Lebaran ini masih dalam musim penghujan, mohon BPJ dan utamanya BPP disiapkan alat, operator, dan respon cepat antisipasi bencana. - Posko pelayanan arus mudik maupun balik di Balai disiapkan dengan baik selama 24 jam. Posko lebaran juga ada di Dishub, mohon seperti tahun-tahun lalu, koordinasi dengan baik antar pemangku kepentingan terkait mudik lebaran. - Mohon BPJ siap dan stanby di lapangan terkait jalur mudik dan balik lebaran. - Yang perlu diwaspadai mudik dan arus balik lebaran 2023 antara lain kemacetan, rest area, tempat wisat dan jalur alternatif. - Mohon semua Kepala BPJ, Satker dan Jalan tol cek kesiapan lebaran mulai sekarang, diantaranya cek lubang, rest area, tempat wisata dan keamanan. Koordinasi dengan satlantas dan para pemangku kepentingan. - Mohon jalan yang masih dalam perbaikan dan dalam penanganan diberi rambu-rambu informasi. - Tetap semangat dalam menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab dengan penuh integritas dan komunikatif dengan jajaran yang ada di lapangan dalam melayani masyarakat untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran.		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
2	Sekretaris - Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan Maret rencana fisik 15,63%, realisasi fisik 17,17%, deviasi 1,54% dan realisasi keuangan 11,49%. - Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan Maret rencana fisik 0,56%, realisasi fisik 2,37%, deviasi 1,81% dan realisasi keuangan 0,79%. - Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan s.d. Bulan Maret rencana fisik 23,90%, realisasi fisik 26,47%, deviasi 2,57% dan realisasi keuangan 14,12%. - Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan Maret rencana fisik 17,77%, realisasi fisik 23,26%, deviasi 5,49% dan realisasi keuangan 18,83%. - PAD s.d Bulan Maret mencapai 23,20% atau Rp.2.181.005.825,00 dari target Rp. 9.400.000.000,00. Tahun ini target PAD naik sehingga mohon Kepala BPJ tetap semangat mendorong pencapaian PAD tahun depan. - Hal - hal yang perlu di perhatikan: - Mohon Para Kepala Bidang dan Balai memerintahkan sub koordinator dan operator untuk menginput RAB Renja 2025 pada aplikasi e planning mulai hari ini sampai dengan Jumat 5 Maret 2024 pukul 12 00 WIB; - Kondisi Jalan pada H 7 Lebaran 2024 secara fungsional dapat melayani arus mudik balik dengan target: - H-7 Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam kondisi siap. Tidak ada kegiatan pekerjaan jalan maupun jembatan. - Paket Peningkatan Pemulihan kondisi jalan eksisting dan tidak ada beda tinggi yang membahayakan pengguna jalan; - Dipastikan tidak ada lubang selama arus mudik dan arus balik; - Siapkan posko mudik balik selama 24 jam dilengkapi peta informasi ruas lokasi rawan kemacetan dan bencana 2024 serta kelengkapan K 3 antara lain obat obatan h elm rompi sepatu boots, dan sebagainya; - Pemasangan rambu lalu lintas petunjuk maupun informasi di sepanjang jalur mudik; - Selalu memantau Klik Binmarcipka kondisi maupun laporan terkait jalan dan jembatan.		Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
3	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 5,20%, realisasi fisik 0,44% dan realisasi keuangan 6,29%.		
4	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 2,44%, realisasi fisik 0,44% dan realisasi keuangan 10,04%.		
5	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 0,32%, realisasi fisik 0,54%, deviasi 0,22% dan realisasi keuangan 0,00%.		
6	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 2,21%, realisasi fisik 1,38% dan realisasi keuangan 0,63%.		
7	Kepala BPJ Wilayah Semarang		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 11,23%, realisasi fisik 42,81% dan realisasi keuangan 21,30%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2024 sebesar Rp. 255.858.000,00 (24,13%).		
	• Kondisi Ruas Jalan menghadapi arus mudik lebaran 2024: 1. Ruas D.I.Panjaitan Bebas Lubang, Ada 1 titik longsor di STA 1+300 dan jalan dibuka 1 lajur, masih aman untuk dilewati arus mudik; 2. Ruas Salatiga-Kedungjati Terdapat 1 titik amblesan di Km.64+400 dan masih dalam proses perbaikan sementara buka 1 lajur dan rencana bisa dibuka 2 lajur pada H-4 Lebaran; 3. Ruas Demak-Godong, Lokasi terdampak banjir Km.43.600-46.450, diluar lokasi peningkatan ditangani Rutin dan akan segera selesai H-3. sudah terpasang rambu' informasi.	Kepala Dinas : Mohon disiapkan dengan baik jalur mudik, titik rawan kemacetan dan rambu-rambu informasi serta bahan material jalan bilamana dibutuhkan utamanya ruas Semarang-Godong.	
8	Kepala BPJ Wilayah Pati		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 21,85%, realisasi fisik 20,28% dan realisasi keuangan 11,89%. • PAD s.d. Bulan Maret 2024 sebesar Rp. 255.766.200,00 (27,13%).		
9	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 28,28%, realisasi fisik 27,61% dan realisasi keuangan 24,98%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2023 sebesar Rp. 181.123.800,00 (18,00%).		
	• Kabupaten Sragen, Purwodadi dan Blora siap dilalui jalur lebaran, sudah koordinasi dengan stakeholder daerah dan semua pemangku kepentingan terkait.		
	• Intensitas hujan di wilayah Purwodadi masih sangat ekstrim sehingga sudah disiapkan untuk arus lebaran mulai dari posko, alat berat, operator dan bahan material bila dibutuhkan.		
10	Kepala BPJ Wilayah Surakarta		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 55,47%, realisasi fisik 51,63% dan realisasi keuangan 18,57%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2023 sebesar Rp. 198.936.550,00 (23,07%).		
	• Kesiapan jalur lebaran di BPJ Surakarta antara lain ttidak adanya jalan berlubang, adanya posko lebaran di kantor BPJ, bahan material dan alat berat serta operator untuk antisipasi adanya bencana alam, rambu-rambu peringatan rawan macet dan longsor serta petanya sudah disiapkan.		
11	Kepala BPJ Wilayah Magelang		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 8,85%, realisasi fisik 39,15% dan realisasi keuangan 9,79%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2023 sebesar Rp. 248.958.645,00 (36,95%).		
	• JJLS dan Jalan Nasional sebagai jalan utama dan alternatif pengalihan lebaran dari Jalan dendles.		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
12	Kepala BPJ Wilayah Wonosobo		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 45,02%, realisasi fisik 52,19% dan realisasi keuangan 9,75%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2023 sebesar Rp. 171.999.000,00 (34,30%).		
	• Lalu lintas ke Dieng dan Batur aman dan siap dilalui jalur lebaran.		
13	Kepala BPJ Wilayah Cilacap		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 46,03%, realisasi fisik 46,48% dan realisasi keuangan 11,10%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2023 sebesar Rp. 330.044.880,00 (39,55%).		
	• Pemasangan rambu-rambu untuk ruas jalan yang padat dan mengalami kemacetan sudah disiapkan.		
14	Kepala BPJ Wilayah Tegal		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 24,79%, realisasi fisik 26,23% dan realisasi keuangan 15,51%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2022 sebesar Rp. 85.585.500,00 (14,93%).		
15	Kepala BPJ Wilayah Pekalongan		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 17,86%, realisasi fisik 34,04% dan realisasi keuangan 20,68%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2023 sebesar Rp. 123.406.500,00 (14,93%).		
16	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 40,56%, realisasi fisik 42,47% dan realisasi keuangan 28,72%.		
	• PAD s.d. Bulan Maret 2022 sebesar Rp. 302.818.000,00 (13,69%).		
17	Kepala Balai Jasa Konstruksi		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 11,90%, realisasi fisik 13,35% dan realisasi keuangan 11,19%.		
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
	• Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan Maret rencana fisik 17,77%, realisasi fisik 23,26%, dan realisasi keuangan 18,83%.		
	• Kegiatan IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) sebesar 30,95 Milyar dengan rincian: 1. Pamsimas sebesar 19,2 Milyar (42 desa) saat ini masih dalam tahap menunggu SK Penetapan lokasi IBM; 2. PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem) sebesar 11,75 Milyar (3 desa) saat ini masih dalam tahap konstruksi.		
19	Kepala Satker PJN Wilayah I		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah I.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 35,36%, realisasi fisik 44,71%, deviasi 9,35% dan realisasi keuangan 20,44%.		
20	Kepala Satker PJN Wilayah II		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah II.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 17,12 18,87%, realisasi fisik 18,87%, deviasi 1,75% dan realisasi keuangan 8,47%.		
21	Kepala Satker PJN Wilayah III		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah III.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 21,69%, realisasi fisik 19,76%, deviasi -1,93% dan realisasi keuangan 14,08%.		
22	Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 22,77%, realisasi fisik 23,23%, deviasi 0,46% dan realisasi keuangan 21,17%.		
23	Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret rencana fisik 0,56%, realisasi fisik 2,37%, deviasi 1,81% dan realisasi keuangan 0,79%.		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
24	Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Maret sebesar 7,14% dan progres lahan siap konstruksi sebesar 73,17%.		
	• Kesiapan jalur lebaran 2024 jembatan kaligawe siap dilewati, 10 pompa air dan 4 rumah pompa air sudah disiapkan untuk menanggulangi banjir/rop.		
25	Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yia Kulon Progo.		Informasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yia Kulon Progo.
	• Ada 7 posko disiapkan untuk jalur lebaran, 8 CCTV pemantau, Sarana layanan lalu lintas untuk jalur lebaran antara lain PJR, ambulan, mobil derek, rescue, manager traffic.		
	• Waktu layanan jalur fungsional pukul 06.00-17.00 WIB. Kendaraan yang diizinkan melintas: - Colomadu s.d. IC kartasura Semua Golongan; - IC kartasura STA 22+000 kendaraan kecil saja Jalur yang digunakan: - STA 0+000 - 2+500 difungsionalkan dua jalur (GT Banyudono GT Kartasura - STA 2+000 - 22+000 difungsionalkan satu jalur menunggu hasil rakor dengan kepolisian dan dishub - arus mudik tgl 5-11 April 2024 - arus balik tgl 12-15 April 2024		
26	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen		Informasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
	• Secara umum Tol Yogyakarta-Bawen belum siap untuk dilalui jalur lebaran, karena masih dalam proses konstruksi di seksi 6 untuk wilayah Jawa Tengah. Kemungkinan ada lonjakan lalu lintas pada exit tol bawen karena ada pekerjaan konstruksi di tol Yogyakarta-Bawen.		
	• Sesuai Arahan Jasamarga saat kunjungan ke lapangan akan ditambahkan shelter sementara pada area ON dan OFF RAMP. Konstruksinya berupa timbunan leveling-LPA (tebal 10 -15 cm) - beton LC 10 cm, Terpasang pagar proyek dan barrier beton pada tepi perkerasan beton khusus akses masuk shelter akan dipasang dengan water Barrier sehingga dapat mudah dipindahkan apabila ada keadaan darurat selama masa libur lebaran 2024 namun tidak untuk menambah lajur kemacetan.		

Mengetahui :

Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



ALI HUDA, ST, MT
NIP. 197402211999031006


Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 196908231997031003

DOKUMENTASI

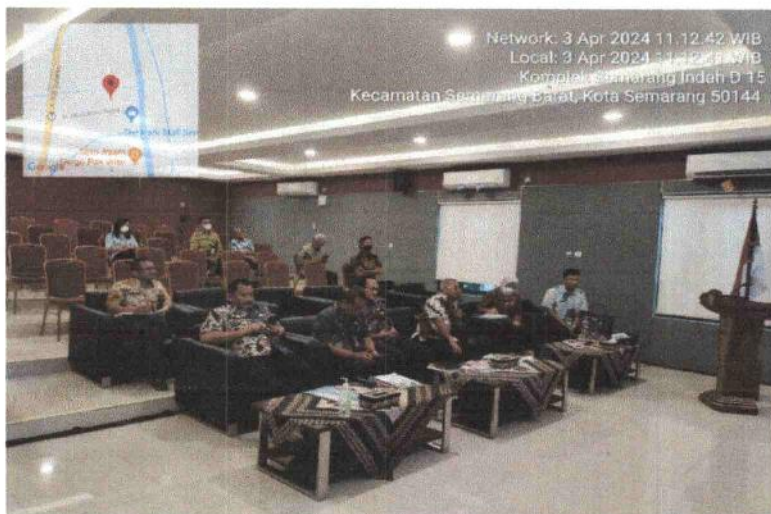

DOKUMENTASI KEGIATAN

