

# RAPÄT TIM PIU PHJD

DINAS PU BINA MARGA DAN

CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 01 November 2021



••

---


# PELAKSANAAN PHJD TA. 2021

# RUAS PENANGGARAN TA. 2021

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang SK Jalan	Penanganan (KM)			Total Anggaran				Panjang (km)	Nilai Kontrak Rencana (Juta)	TOTAL PAGU (Rp.) (Juta)	KET.
				PR + RK (KM)	Pelebaran		PR + RK (Rp)		Pelebaran (Juta)					
					Panjang (KM)	KM - KM	Satuan	Total	Satuan	Total				
1	106	Dieng -Kejajar	10,20	10,20	-		92,24	940,86		-	10,20	940,86	11.119,69	PAKET 1
2	107	Wonosobo - Kejajar	13,00	10,00	3,00	69+330 - 71+030	92,24	922,42	3.085,47	9.256,41	13,00	10.178,82		
						71+070 - 72+370								
3	167	Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo	8,60	8,60	-		47,06	404,72		-	8,60	404,72	13.619,93	PAKET 2
4	164	Kartek - Kepil	19,14	15,69	3,45	60+825 - 64+275	47,06	738,38	2.748,65	9.482,86	19,14	10.221,23		
5	166	Maron - Kemiri	10,98	10,98	-		47,06	516,72		-	10,98	516,72		
6	165	Maron - Purworejo	2,94	2,94	-		47,06	138,36		-	2,94	138,36		
7	168	Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo	8,25	8,25	-		47,06	388,25		-	8,25	388,25		
8	169	Bener -Bts. Kab. Purworejo	12,10	12,10	-		47,06	569,43		-	12,10	569,43		
9	171	Salaman - Borobudur	8,07	8,07	-		47,06	379,78		-	8,07	379,78		
10	172	Magelang - Salaman	13,75	13,75	-		47,06	647,08		-	13,75	647,08		
11	182	Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang)	7,53	7,53	-		47,06	354,36		-	7,53	354,36		
12	183	Blabak - Jrah/Selo Bts. Kab. Bojolali	25,31	24,59	0,72	09+860 - 10+038	49,54	1.218,34	2.590,97	1.860,32	25,31	3.078,66		
						13+500 14+040								
13	184	Boyolali - Jrah/Selo Bts. Kab. Magelang	24,32	20,85	3,48	27+900 - 31+375	49,54	1.032,71	2.590,97	9.003,63	24,32	10.036,33		
<b>Total</b>			<b>164,19</b>	<b>153,55</b>	<b>10,64</b>			<b>8.251,41</b>		<b>29.603,21</b>	<b>164,19</b>	<b>37.854,62</b>	<b>37.854,62</b>	

# PETA PENANGANAN . .

TA. 2021

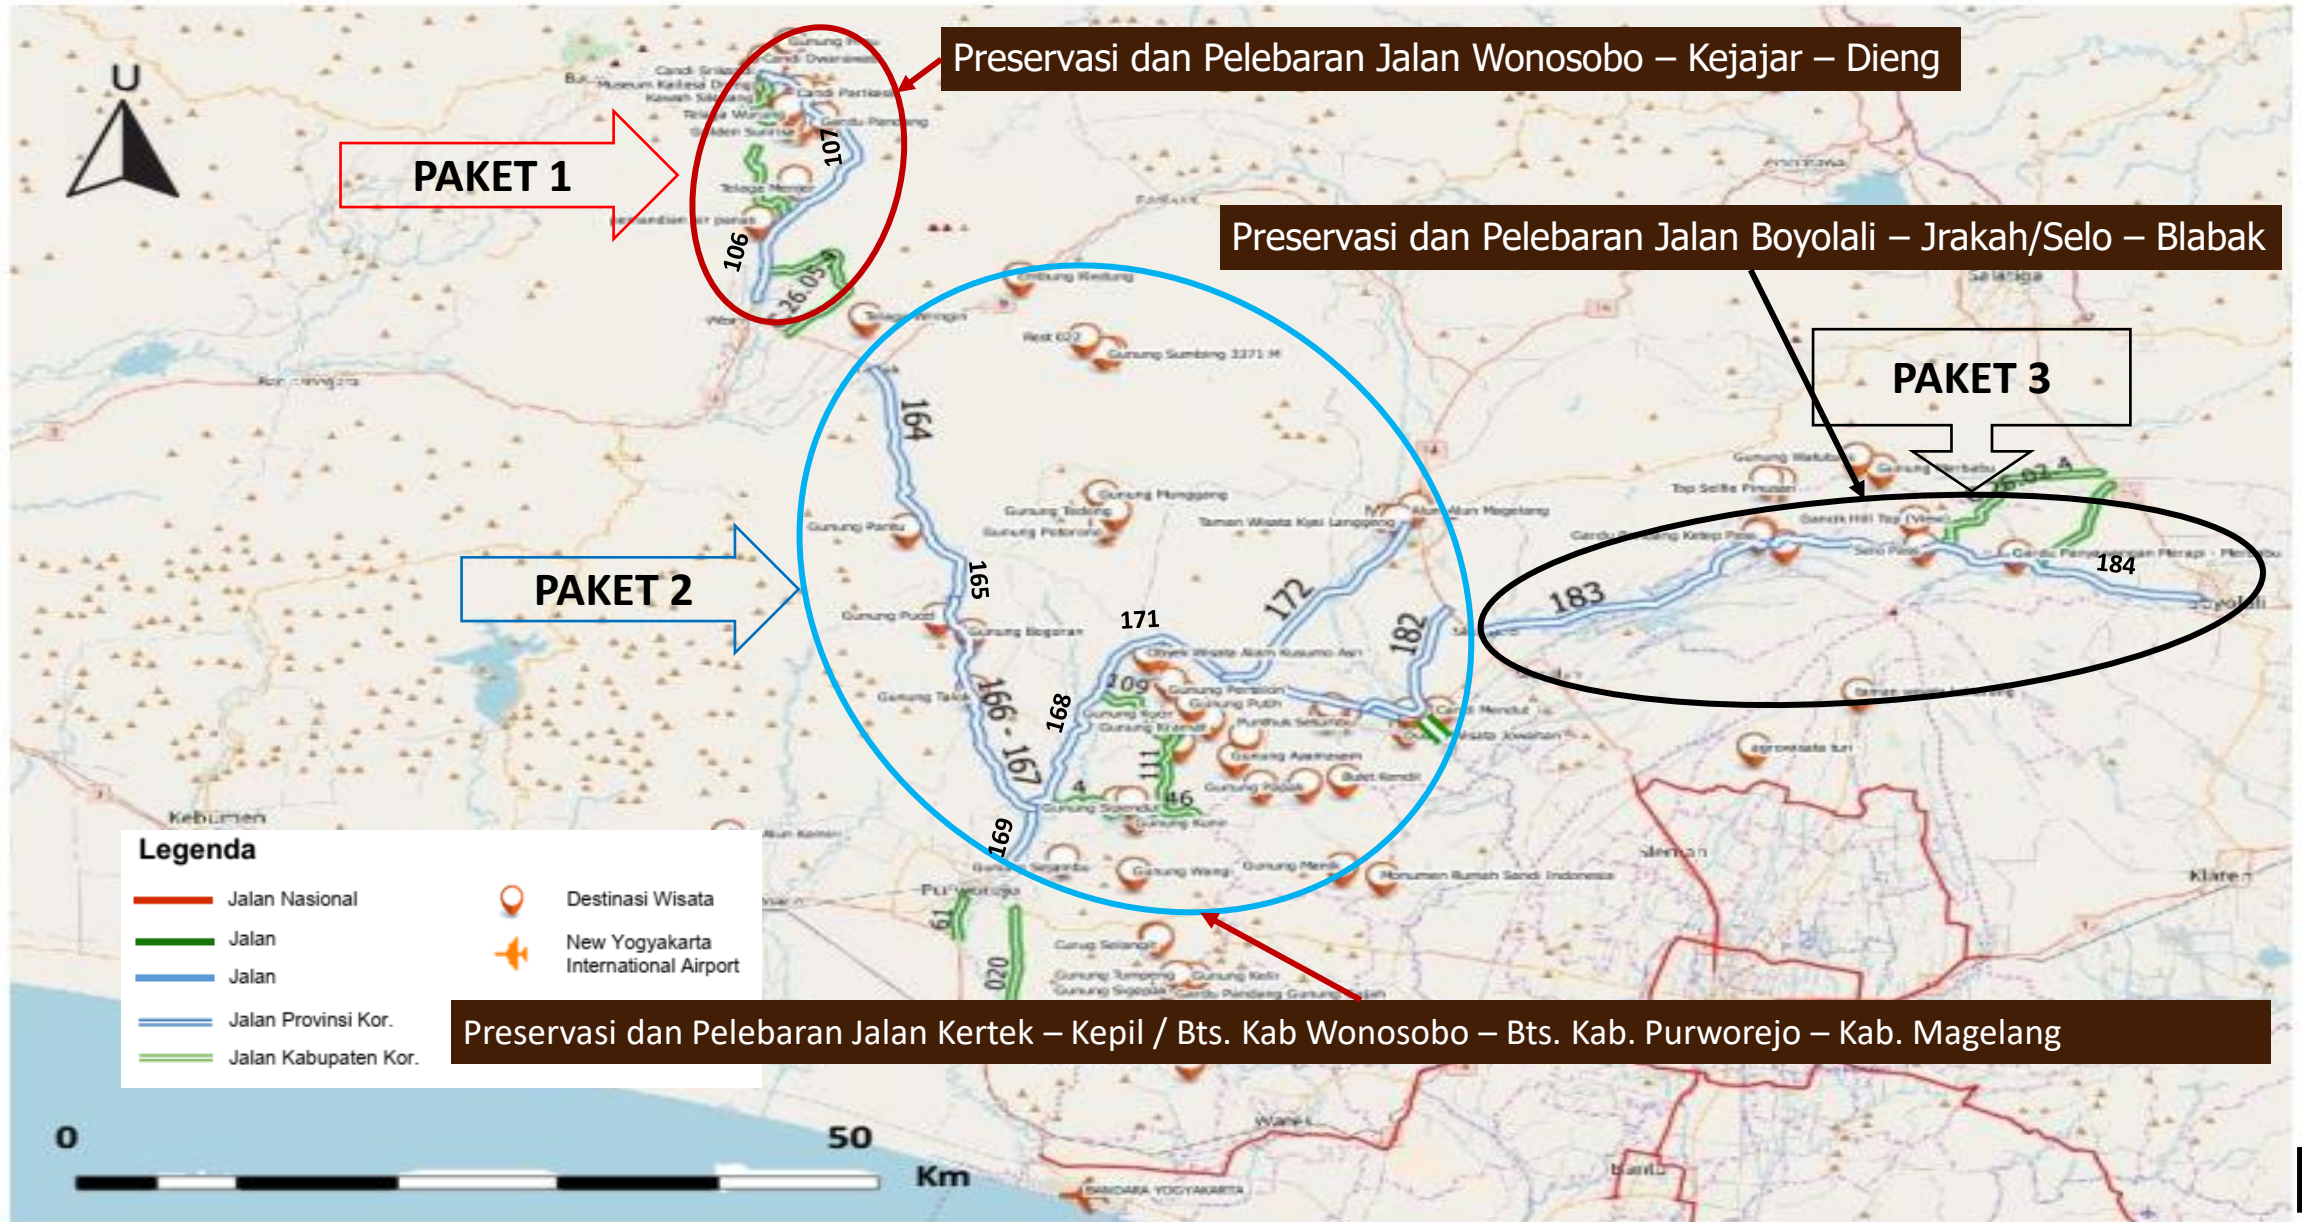

# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG**

- 1. Nama Paket** : **Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Wonosobo - Kejajar-Dieng (PHJD)**
2. Penyedia : PT. JATI AGUNG ARSITAMA
3. Konsultan Pengawas : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam
4. Nilai Pagu : Rp 11.585.730.000,00
5. Nilai Kontrak : Rp 11.064.343.000,00
6. Nomor dan Tanggal Kontrak : No. 620/979 Tanggal 26 April 2021
7. Waktu Pelaksanaan : 187 Hari Kalender
8. Rencana PHO : 29 Oktober 2021
9. Lingkup Pekerjaan : Pelebaran 4,6 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 2,49 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 20,71 Km





# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG**


### **LOKASI PEKERJAAN**

1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 3,00 Km
  - a. Nomor Ruas : 107 ; KM BMS. 69+330 s.d 71+030 dan KM 71+070 s.d 72+370
  - b. Nama Ruas : Wonosobo-Kejajar
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo
  - d. Desa / Kecamatan : Desa Kuripan, Kec. Garung
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non efektif 20, 20 Km
  - a. Nomor Ruas : 106, 107
  - b. Nama Ruas : Dieng - Kejajar dan Wonosobo - Kejajar
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo

### **URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)**

1. Pelebaran Dari 4,6 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN WONOSOBO – KEJAJAR – DIENG

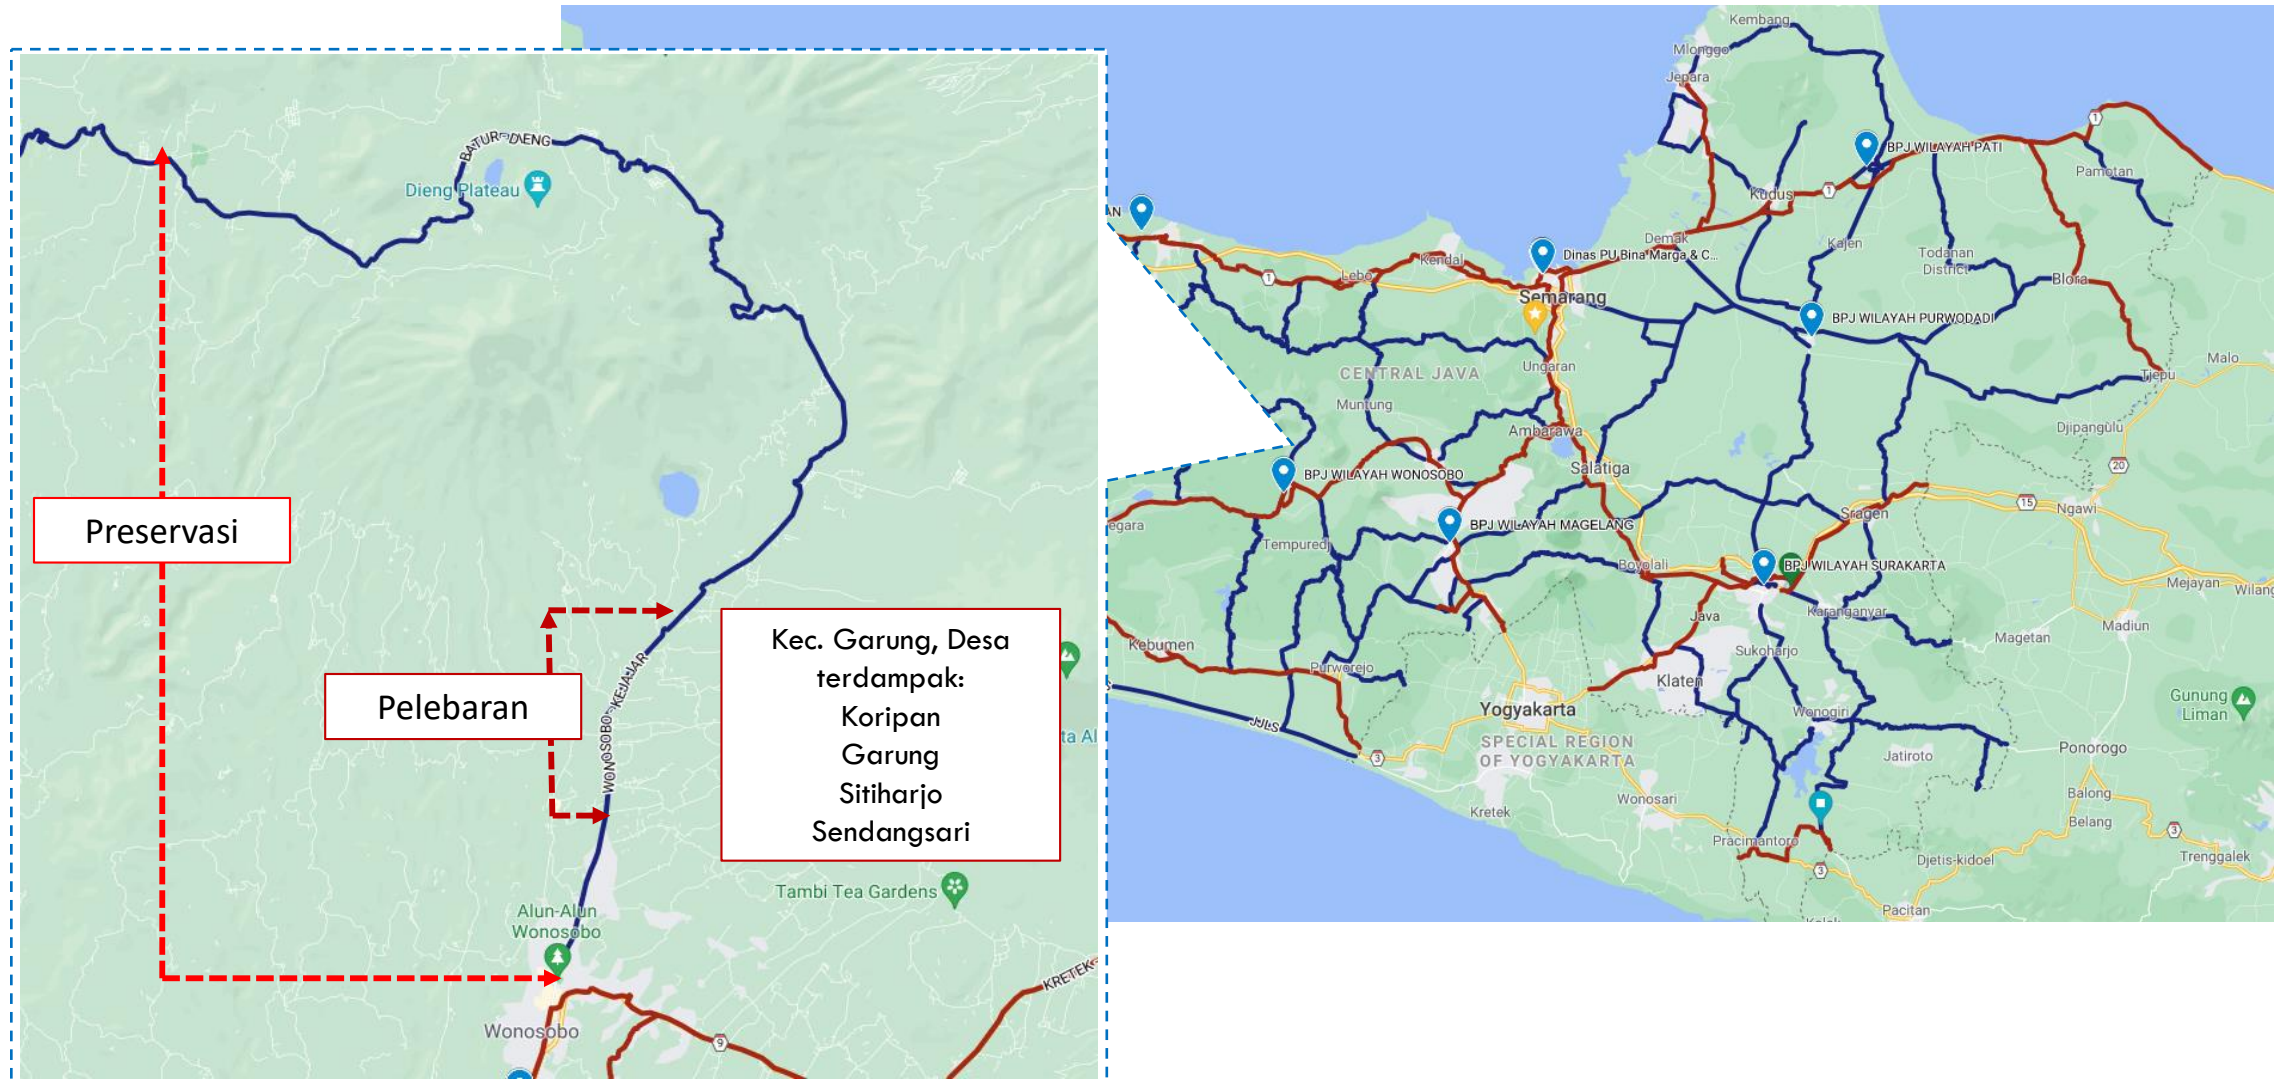

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG

0%

100%

PELEBARAN



PRESERVASI





# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG

PROGRES per 29 Oktober 2021:

RENCANA : 100 %

REALISASI : 100 %

DEVIASI : 0 %

PHO tanggal 29 Oktober 2021:



# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

**KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG**

- 1. Nama Paket** : **Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kertek-Kepil-Bts. Kab. Wonosobo-Bts. Kab. Purworejo-Kab. Magelang (PHJD)**
2. Penyedia : PT. VALENTARA SARANA RAYA
3. Konsultan Pengawas : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam
4. Nilai Pagu : Rp 14.158.410.000,00
5. Nilai Kontrak : Rp 13.619.933.000,00
6. Nomor dan Tanggal Kontrak : No. 620/980 Tanggal 26 April 2021
7. Waktu Pelaksanaan : 187 Hari Kalender
8. Rencana PHO : 29 Oktober 2021
9. Lingkup Pekerjaan : Pelebaran 4,6 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 2,51 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 88,85 Km





# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG**

### **LOKASI PEKERJAAN**


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 3,45 Km
  - a. Nomor Ruas : 164 ; KM BMS. 60 + 825 s.d 64 + 275
  - b. Nama Ruas : Kertek -Kepil
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo
  - d. Desa / kecamatan : Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non Efektif 87,91 Km
  - a. Nomor Ruas : 164,165 – 169,171 – 172, dan 182
  - b. Nama Ruas : Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo, Kertek – Kepil, Maron – Kemiri, Maron – Purworejo, Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo, Bener -Bts. Kab. Purworejo, Salaman – Borobudur, Magelang – Salaman, Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang).
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo, Magelang, dan Purworejo

### **URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)**

1. Pelebaran Dari 4,6 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin.

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

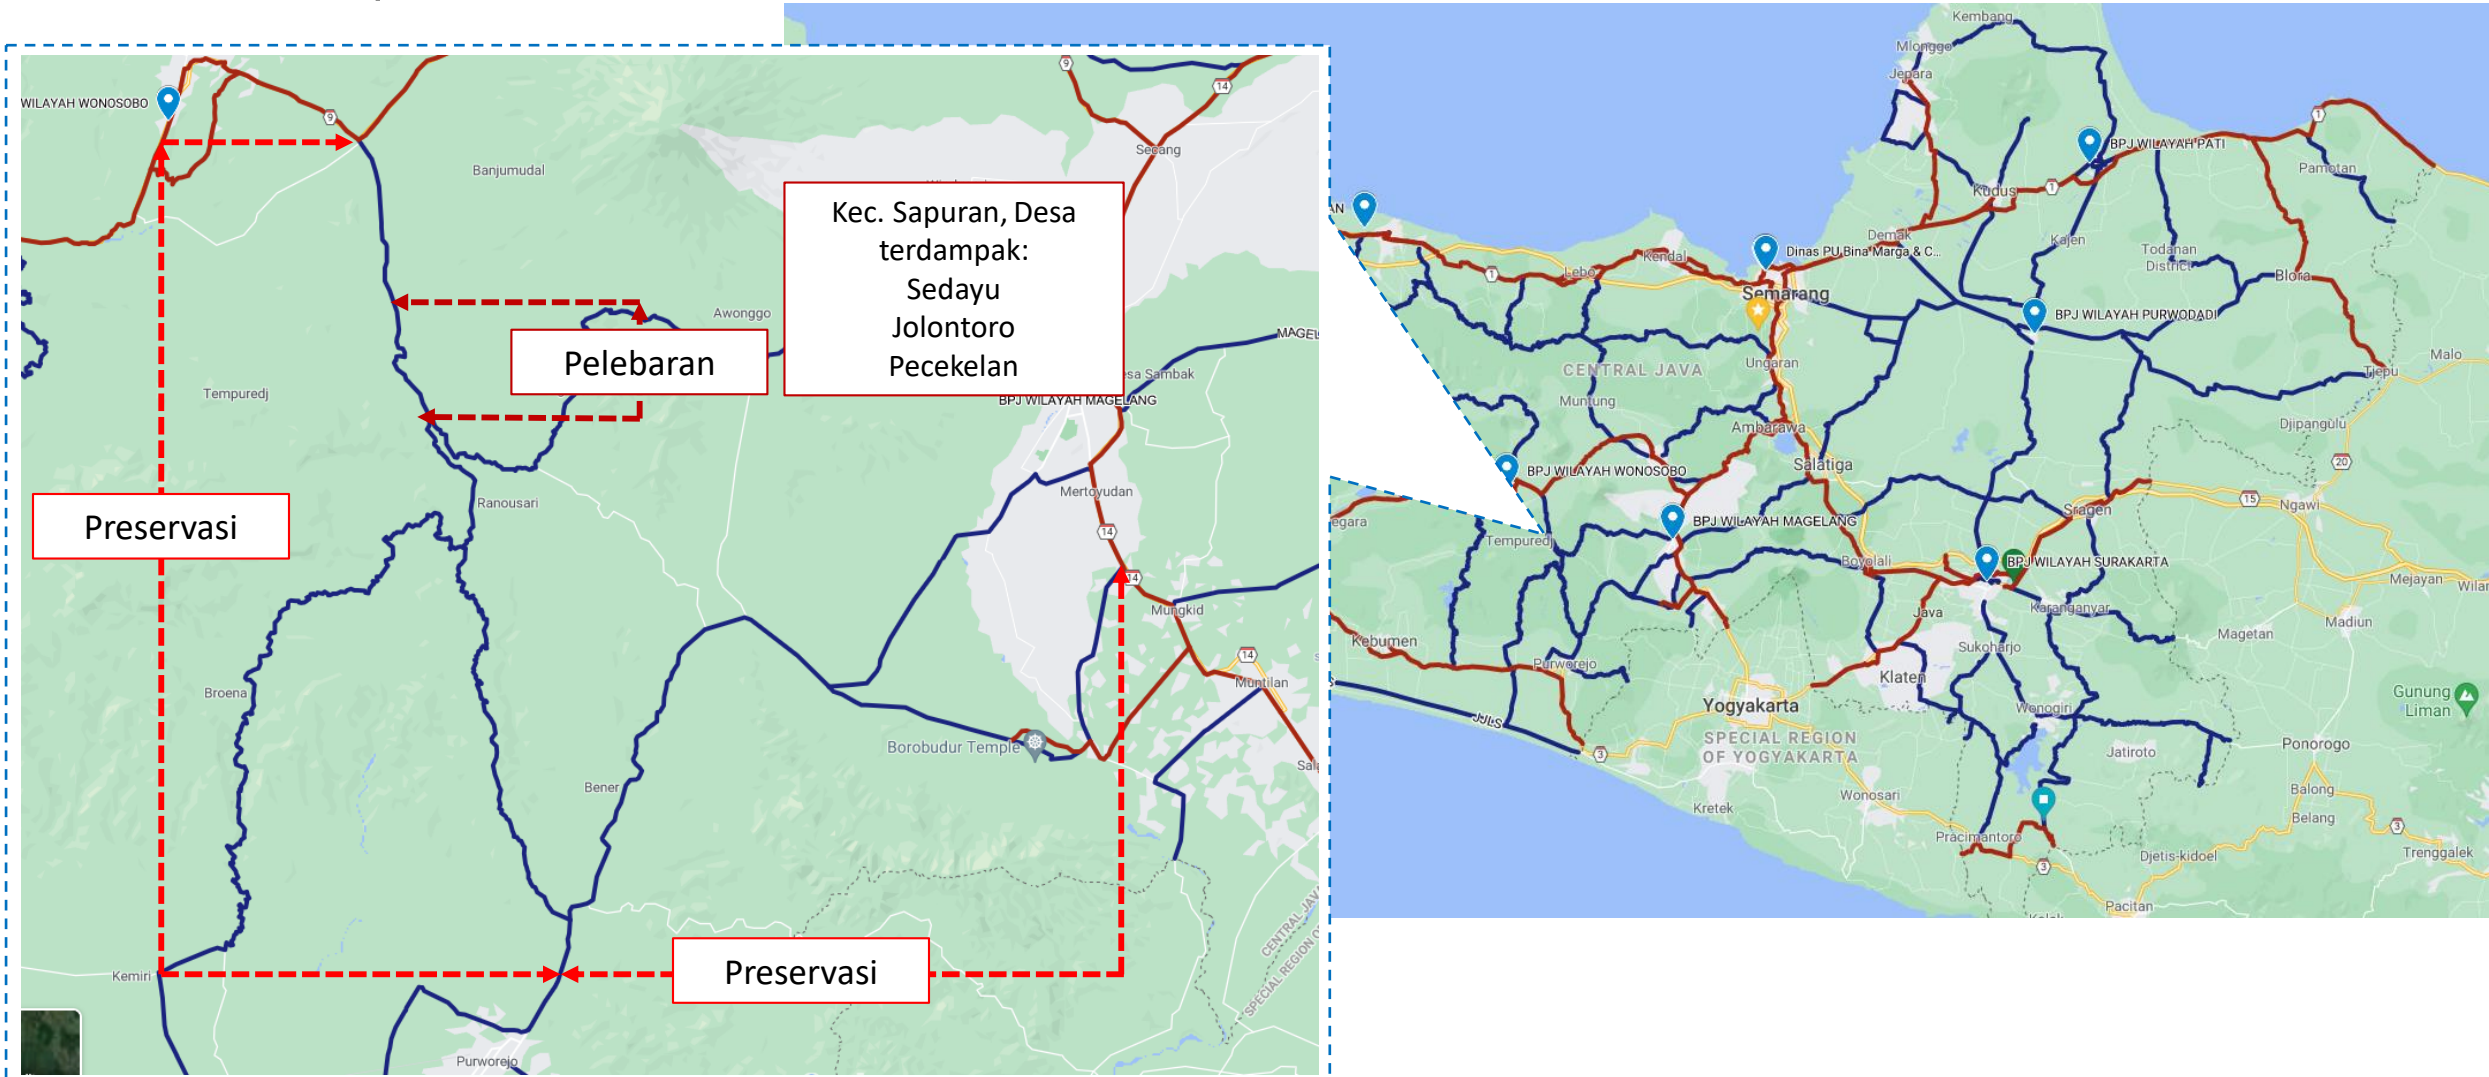

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

0%

100%

PELEBARAN



PRESERVASI



# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

PROGRES per 29 Oktober 2021:

RENCANA : 100 %

REALISASI : 100 %

DEVIASI : 0 %


PHO tanggal 29 Oktober 2021:



# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK**

- 1. Nama Paket** : **Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak (PHJD)**
2. Penyedia : PT.WIRA BHAKTI MULIA-PT. BERUANG BANYAK SEKALI KSO
3. Konsultan Pengawas : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam
4. Nilai Pagu : Rp 14.255.860.000,00
5. Nilai Kontrak : Rp 13.114.995.000,00
6. Nomor dan Tanggal Kontrak : No. 620/833 Tanggal 14 April 2021
7. Waktu Pelaksanaan : 199 Hari Kalender
8. Rencana PHO : 29 Oktober 2021
9. Lingkup Pekerjaan : Pelebaran 6 m menjadi 8,4 m, Panjang Efektif 3,3 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 46,3 Km

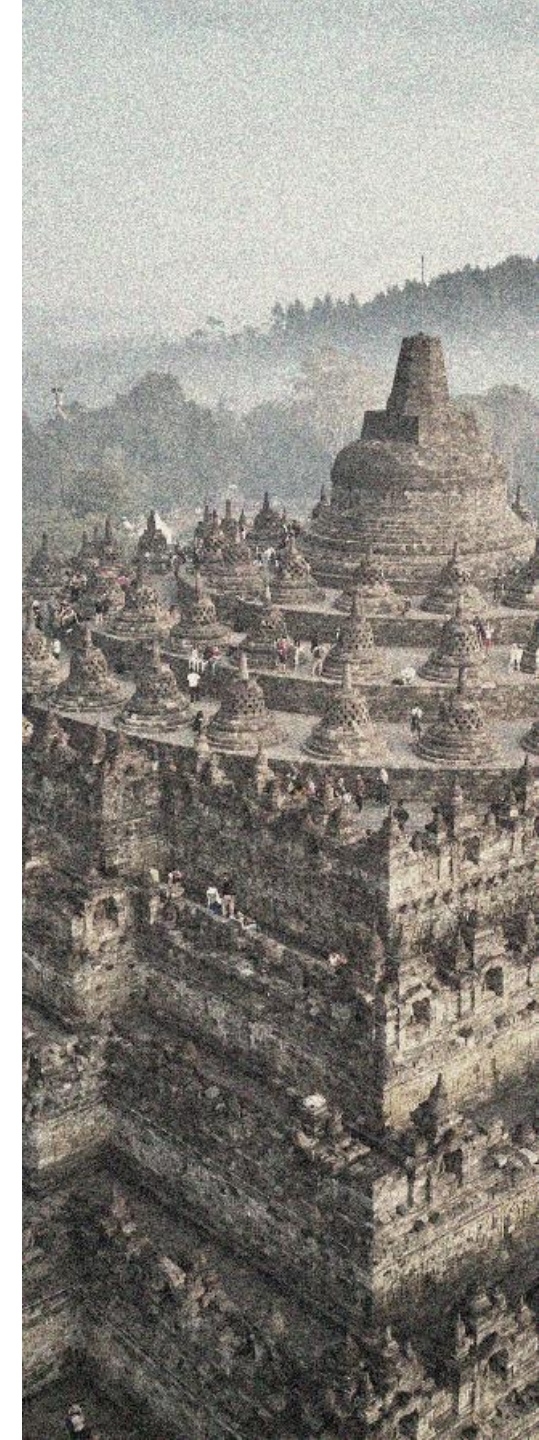



# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK**

### **LOKASI PEKERJAAN**

1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 4,20 Km
  - a. Nomor Ruas : 183 ; KM SKA. 09+860 s.d 10+038 dan KM. 13+500 s.d 14+040  
184 ; KM SKA. 27+900 s.d 31+375
  - b. Nama Ruas : Boyolali – Selo - Jragung
  - c. Kabupaten/Kota : Boyolali
  - d. Desa / kecamatan : Desa Winong, Kecamatan Boyolali
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non Efektif 49,63Km
  - a. Nomor Ruas : 183, 184
  - b. Nama Ruas : Blabak – Jragung dan Boyolali – Selo - Jragung
  - c. Kabupaten/Kota : Magelang, dan Boyolali


### **URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)**

1. Pelebaran Dari 6,0 M Menjadi 8,4 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin.



# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

## BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

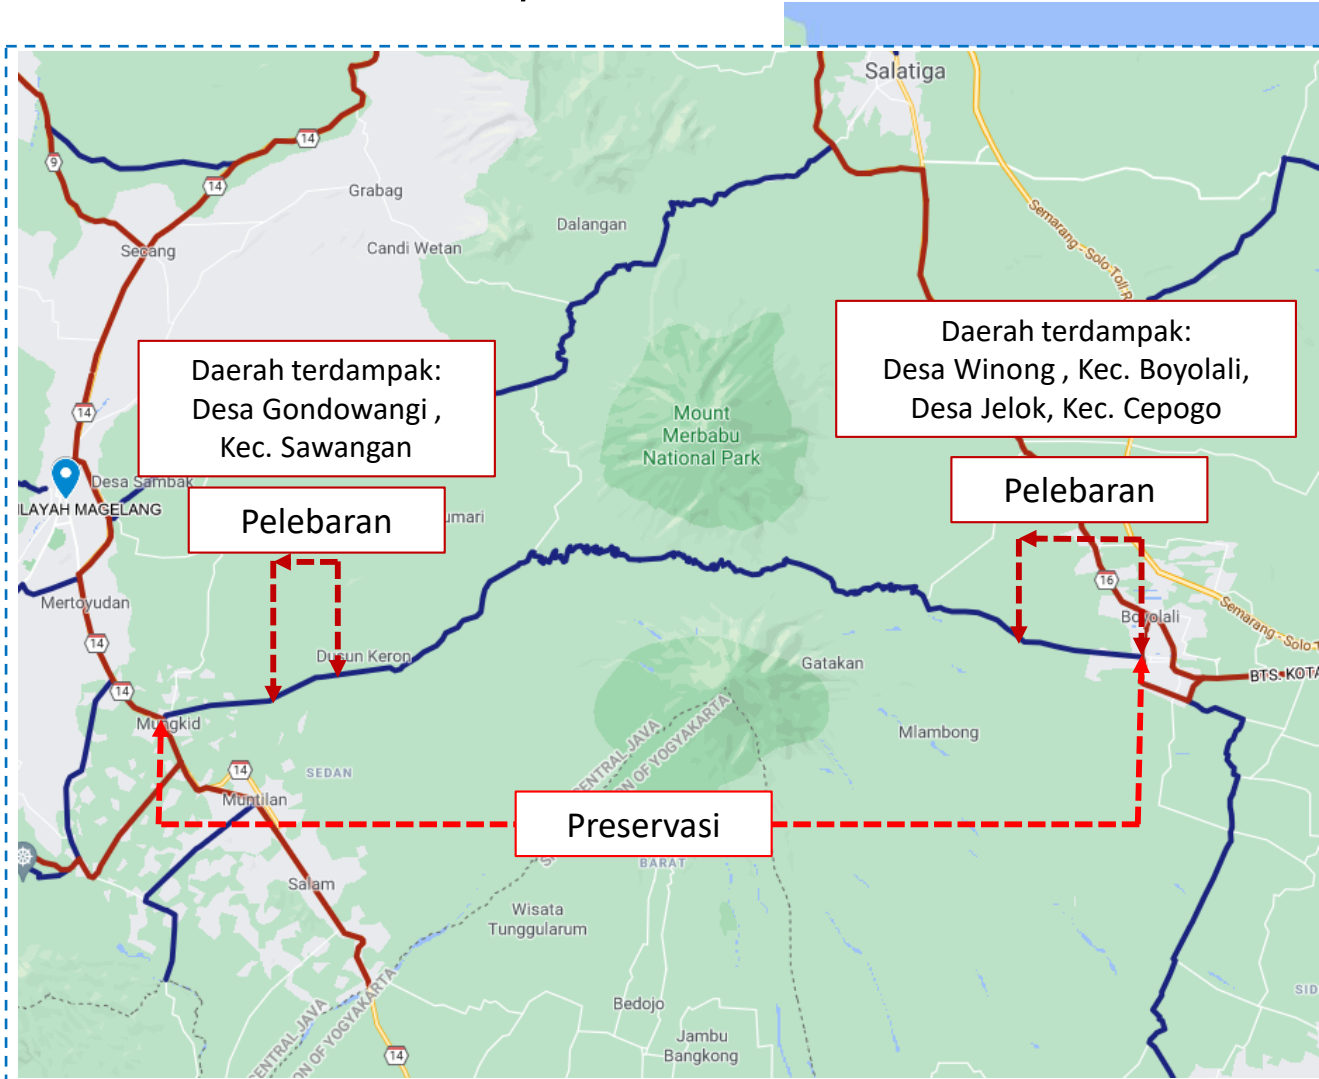

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

0%

100%

PELEBARAN



PRESERVASI



# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

PROGRES per 29 Oktober 2021:

RENCANA : 100 %

REALISASI : 100 %

DEVIASI : 0 %

PHO tanggal 29 Oktober 2021:



# WEBSITE JAWA TENGAH



**jatengprov.go.id**

PORTAL RESMI PROVINSI JAWA TENGAH



## WebGIS Jalan

Geographic Information System data spasial jalan di Jawa Tengah.

➔ Kunjungi halaman



## Jalan Cantik

Aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

➔ Kunjungi halaman



## Cuitan Twitter

Sampaikan saran Anda dengan singkat dan sopan, menuju Jateng Sejahtera

➔ Buka Twitter



## PPID Pembantu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas PU Binmarcipka

➔ Kunjungi halaman



## Silakon

Laboratorium Pengujian BP2 Provinsi Jawa Tengah

➔ Kunjungi halaman

