


# PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH

Update Progress: 17 Oktober 2021

PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA



# PETA PENANGGAMAN

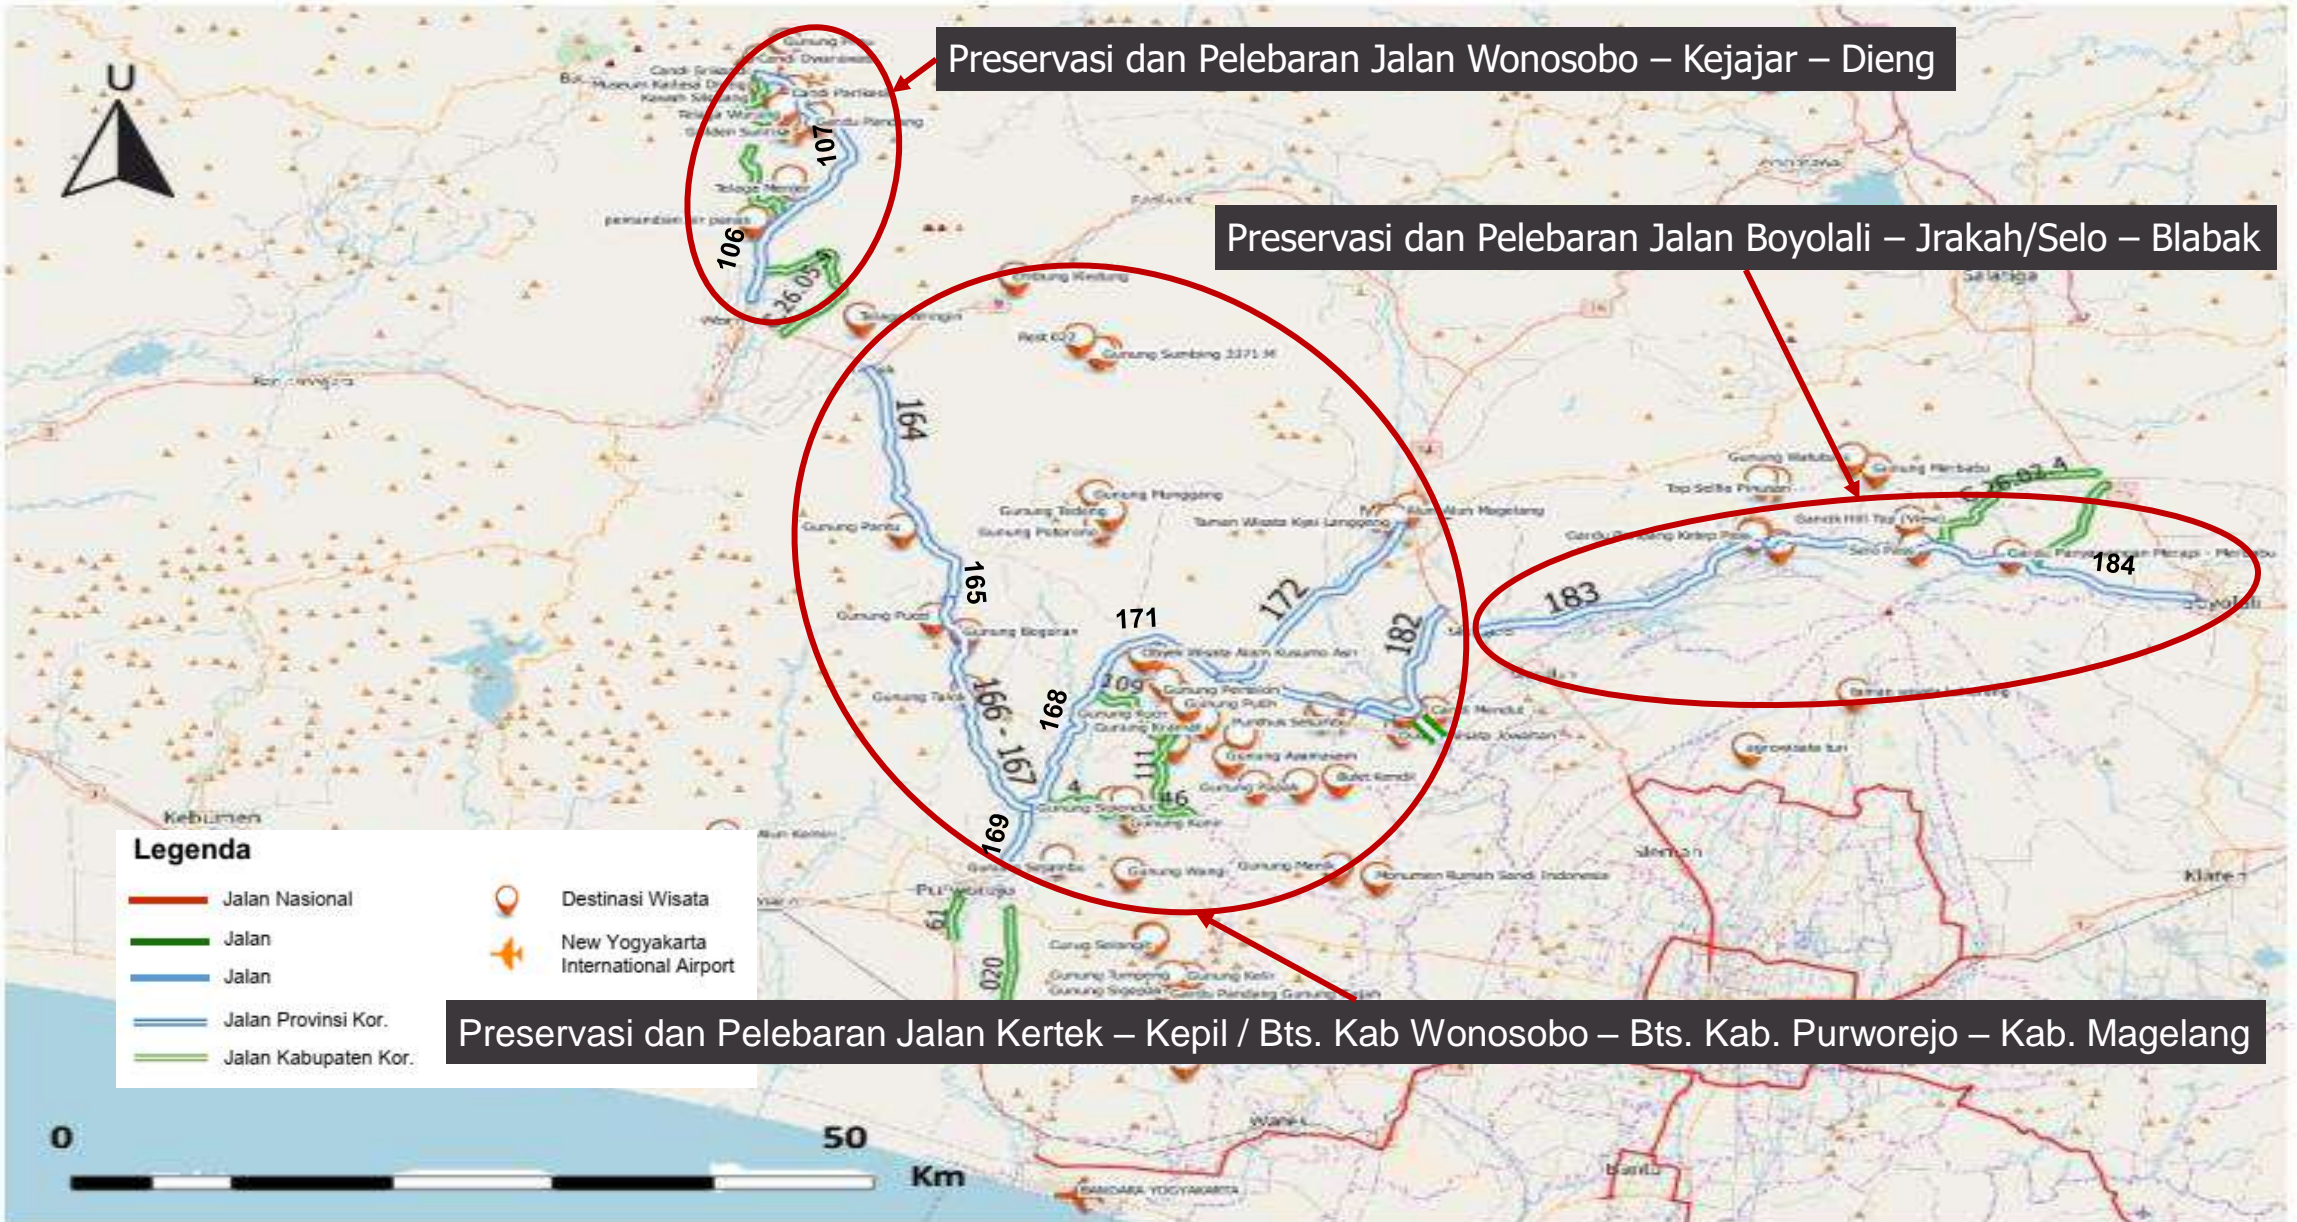

# RUAS PENANGGARAN

| No           | No Ruas | Nama Ruas                                 | Panjang SK Jalan | Penanganan Dalam KM                       |               |  | PAKET   |
|--------------|---------|---|------------------|---|---------------|--|---------|
|              |         |   |                  | Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi (KM) | Pelebaran(KM) |  |         |
|              |         |   |                  |   | Target (KM)   | STA                                    |         |
| 1            | 106     | Dieng -Kejajar                            | 10,20            | 10,20                                     |               |  | PAKET-1 |
| 2            | 107     | Wonosobo - Kejajar                        | 13,00            | 11,15                                     | 3,00          | 69+330 s.d 71+030<br>71+070 s.d 72+370 |         |
| 3            | 167     | Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo          | 8,60             | 8,60                                      |               |  | PAKET-2 |
| 4            | 164     | Kertek - Kepil                            | 19,14            | 17,44                                     | 3,45          | 60 + 825 s.d 64+275                    |         |
| 5            | 166     | Maron - Kemiri                            | 10,98            | 10,98                                     |               |  |         |
| 6            | 165     | Maron - Purworejo                         | 2,94             | 2,94                                      |               |  |         |
| 7            | 168     | Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo        | 8,25             | 8,25                                      |               |  |         |
| 8            | 169     | Bener -Bts. Kab. Purworejo                | 12,10            | 12,10                                     |               |  |         |
| 9            | 171     | Salaman - Borobudur                       | 8,07             | 8,07                                      |               |  |         |
| 10           | 172     | Magelang - Salaman                        | 13,75            | 13,75                                     |               |  |         |
| 11           | 182     | Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang)     | 7,53             | 7,53                                      |               |  | PAKET-3 |
| 12           | 183     | Blabak - Jrasah/Selo Bts. Kab. Boyolali   | 25,31            | 24,81                                     | 0,72          | 09+860 s.d 10+038<br>13+500 s.d 14+040 |         |
| 13           | 184     | Boyolali - Jrasah/Selo Bts. Kab. Magelang | 24,32            | 22,50                                     | 3,48          | 27+900 s.d 31+375                      |         |
| <b>Total</b> |         |   | <b>164,19</b>    | <b>158,32</b>                             | <b>10,64</b>  |  |         |

# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG**

- 1. Nama Paket** : **Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Wonosobo - Kejajar-Dieng (PHJD)**
2. Penyedia : PT. JATI AGUNG ARSITAMA
3. Konsultan Pengawas : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam
4. Nilai Pagu : Rp 11.585.730.000,00
5. Nilai Kontrak : Rp 11.064.343.000,00
6. Nomor dan Tanggal Kontrak : No. 620/979 Tanggal 26 April 2021
7. Waktu Pelaksanaan : 187 Hari Kalender
8. Rencana PHO : 29 Oktober 2021
9. Lingkup Pekerjaan : Pelebaran 4,6 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 3,00 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 20,20 Km





# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG**


### **LOKASI PEKERJAAN**

1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 3,00 Km
  - a. Nomor Ruas : 107 ; KM BMS. 69+330 s.d 71+030 dan KM 71+070 s.d 72+370
  - b. Nama Ruas : Wonosobo-Kejajar
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo
  - d. Desa / Kecamatan : Desa Kuripan, Kec. Garung
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non efektif 20, 20 Km
  - a. Nomor Ruas : 106, 107
  - b. Nama Ruas : Dieng - Kejajar dan Wonosobo - Kejajar
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo

### **URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)**

1. Pelebaran Dari 4,6 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG

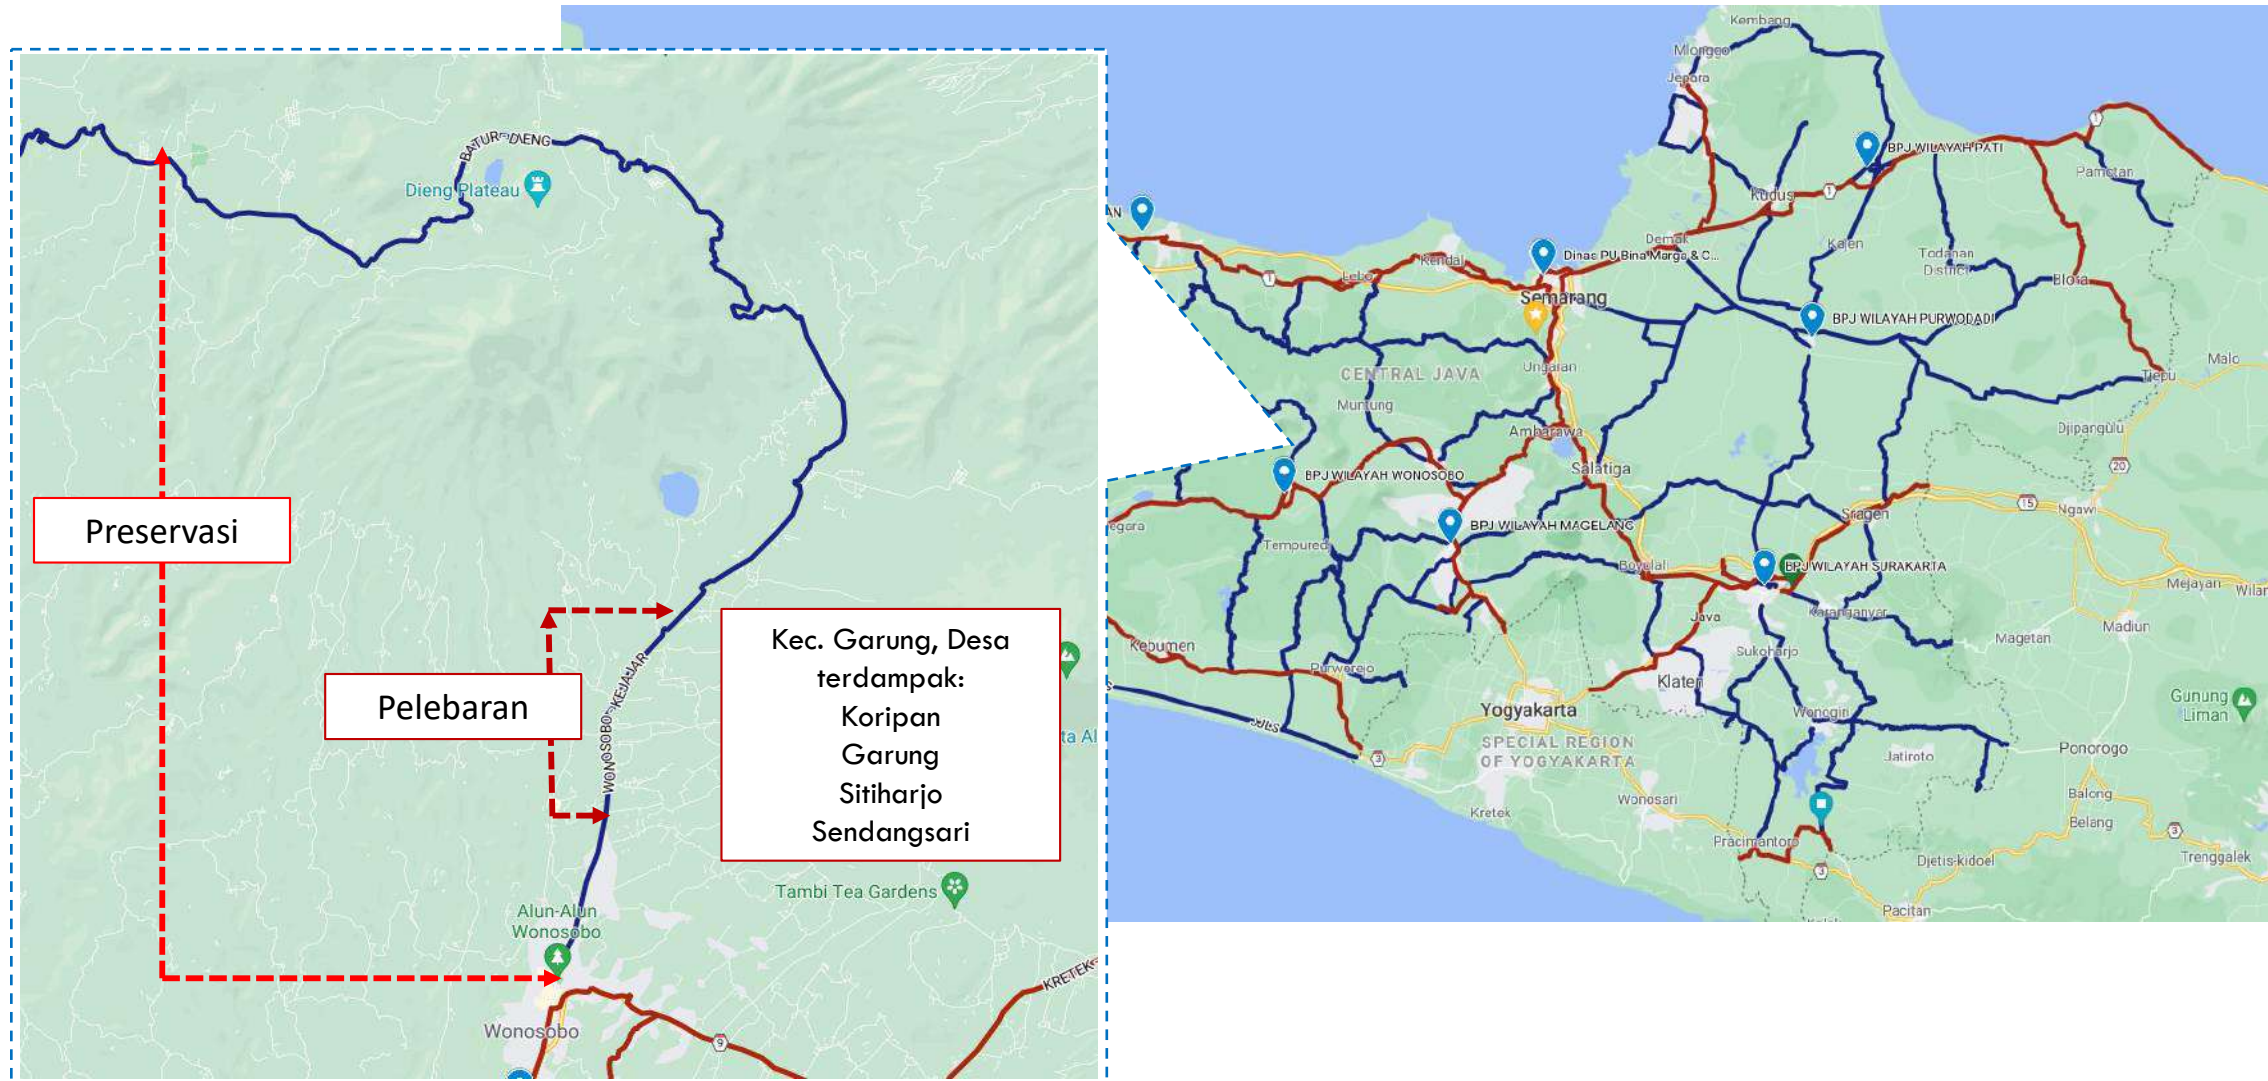

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG

## PELEBARAN



## PRESERVASI



**PROGRES per 17 Oktober 2021:**

**RENCANA : 93,36 %**

**REALISASI : 95,10 %**

**DEVIASI : 1,74 %**

# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

**KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG**

- 1. Nama Paket** : **Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kertek-Kepil-Bts. Kab. Wonosobo-Bts. Kab. Purworejo-Kab. Magelang (PHJD)**
2. Penyedia : PT. VALENTARA SARANA RAYA
3. Konsultan Pengawas : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam
4. Nilai Pagu : Rp 14.158.410.000,00
5. Nilai Kontrak : Rp 13.619.933.000,00
6. Nomor dan Tanggal Kontrak : No. 620/980 Tanggal 26 April 2021
7. Waktu Pelaksanaan : 187 Hari Kalender
8. Rencana PHO : 29 Oktober 2021
9. Lingkup Pekerjaan : Pelebaran 4,6 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 3,45 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 87,91 Km







# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG**

### **LOKASI PEKERJAAN**


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 3,45 Km
  - a. Nomor Ruas : 164 ; KM BMS. 60 + 825 s.d 64 + 275
  - b. Nama Ruas : Kertek -Kepil
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo
  - d. Desa / kecamatan : Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non Efektif 87,91 Km
  - a. Nomor Ruas : 164,165 – 169,171 – 172, dan 182
  - b. Nama Ruas : Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo, Kertek – Kepil, Maron – Kemiri, Maron – Purworejo, Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo, Bener -Bts. Kab. Purworejo, Salaman – Borobudur, Magelang – Salaman, Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang).
  - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo, Magelang, dan Purworejo

### **URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)**

1. Pelebaran Dari 4,6 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin.

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

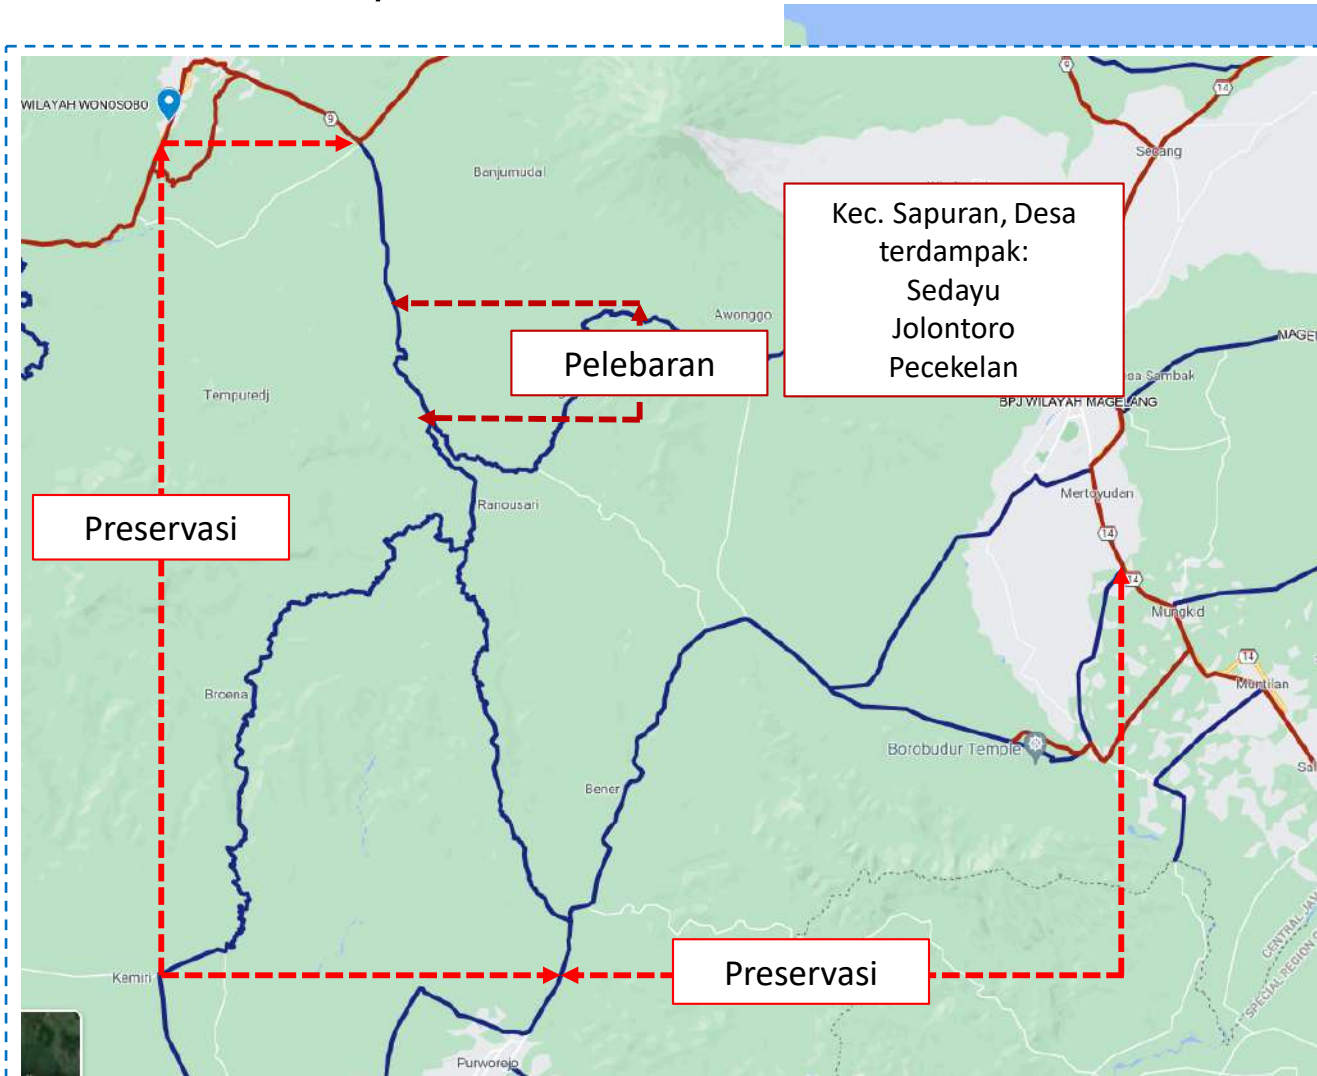

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

PELEBARAN

PRESERVASI



PROGRES per 17 Oktober 2021:

RENCANA : 94,609 %


REALISASI : 98,442%

DEVIASI : 3,833 %

# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK**

- 1. Nama Paket** : **Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak (PHJD)**
2. Penyedia : PT.WIRA BHAKTI MULIA-PT. BERUANG BANYAK SEKALI KSO
3. Konsultan Pengawas : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam
4. Nilai Pagu : Rp 14.255.860.000,00
5. Nilai Kontrak : Rp 13.114.995.000,00
6. Nomor dan Tanggal Kontrak : No. 620/833 Tanggal 14 April 2021
7. Waktu Pelaksanaan : 199 Hari Kalender
8. Rencana PHO : 29 Oktober 2021
9. Lingkup Pekerjaan : Pelebaran 6 m menjadi 8,4 m, Panjang Efektif 4,2 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 49,63 Km

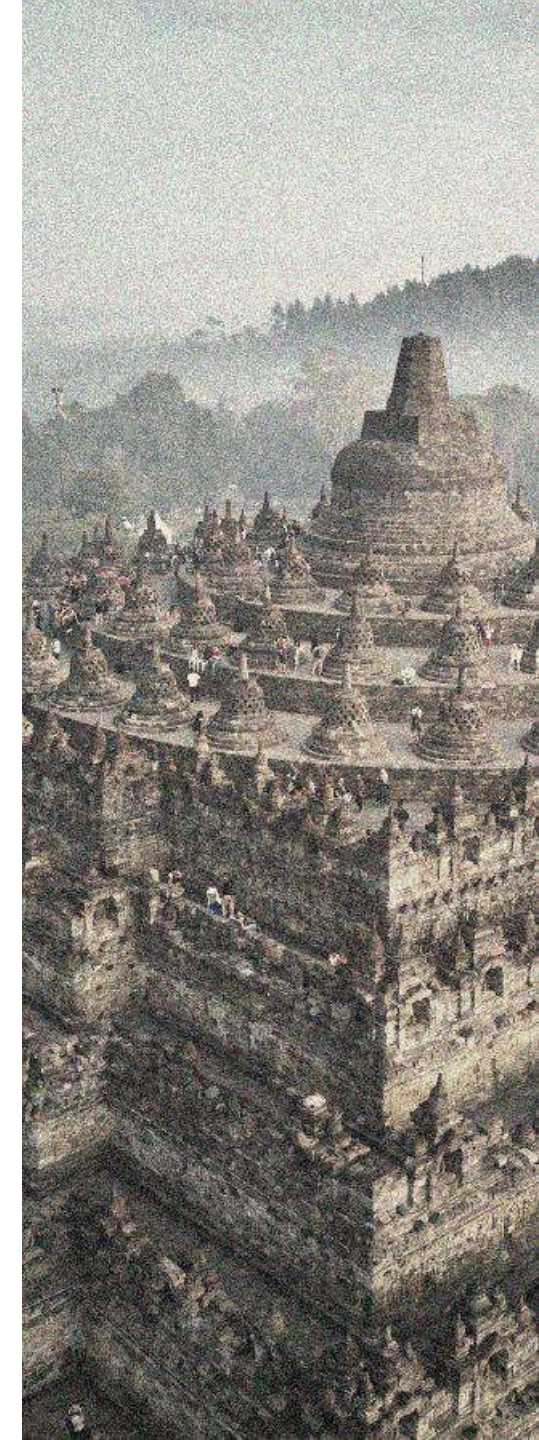



# **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN**

## **BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK**

### **LOKASI PEKERJAAN**


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 4,20 Km
  - a. Nomor Ruas : 183 ; KM SKA. 09+860 s.d 10+038 dan KM. 13+500 s.d 14+040  
184 ; KM SKA. 27+900 s.d 31+375
  - b. Nama Ruas : Boyolali – Selo - Jrakah
  - c. Kabupaten/Kota : Boyolali
  - d. Desa / kecamatan : Desa Winong, Kecamatan Boyolali
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non Efektif 49,63Km
  - a. Nomor Ruas : 183, 184
  - b. Nama Ruas : Blabak – Jrakah dan Boyolali – Selo - Jrakah
  - c. Kabupaten/Kota : Magelang, dan Boyolali

### **URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)**

1. Pelebaran Dari 6,0 M Menjadi 8,4 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin.

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

## BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

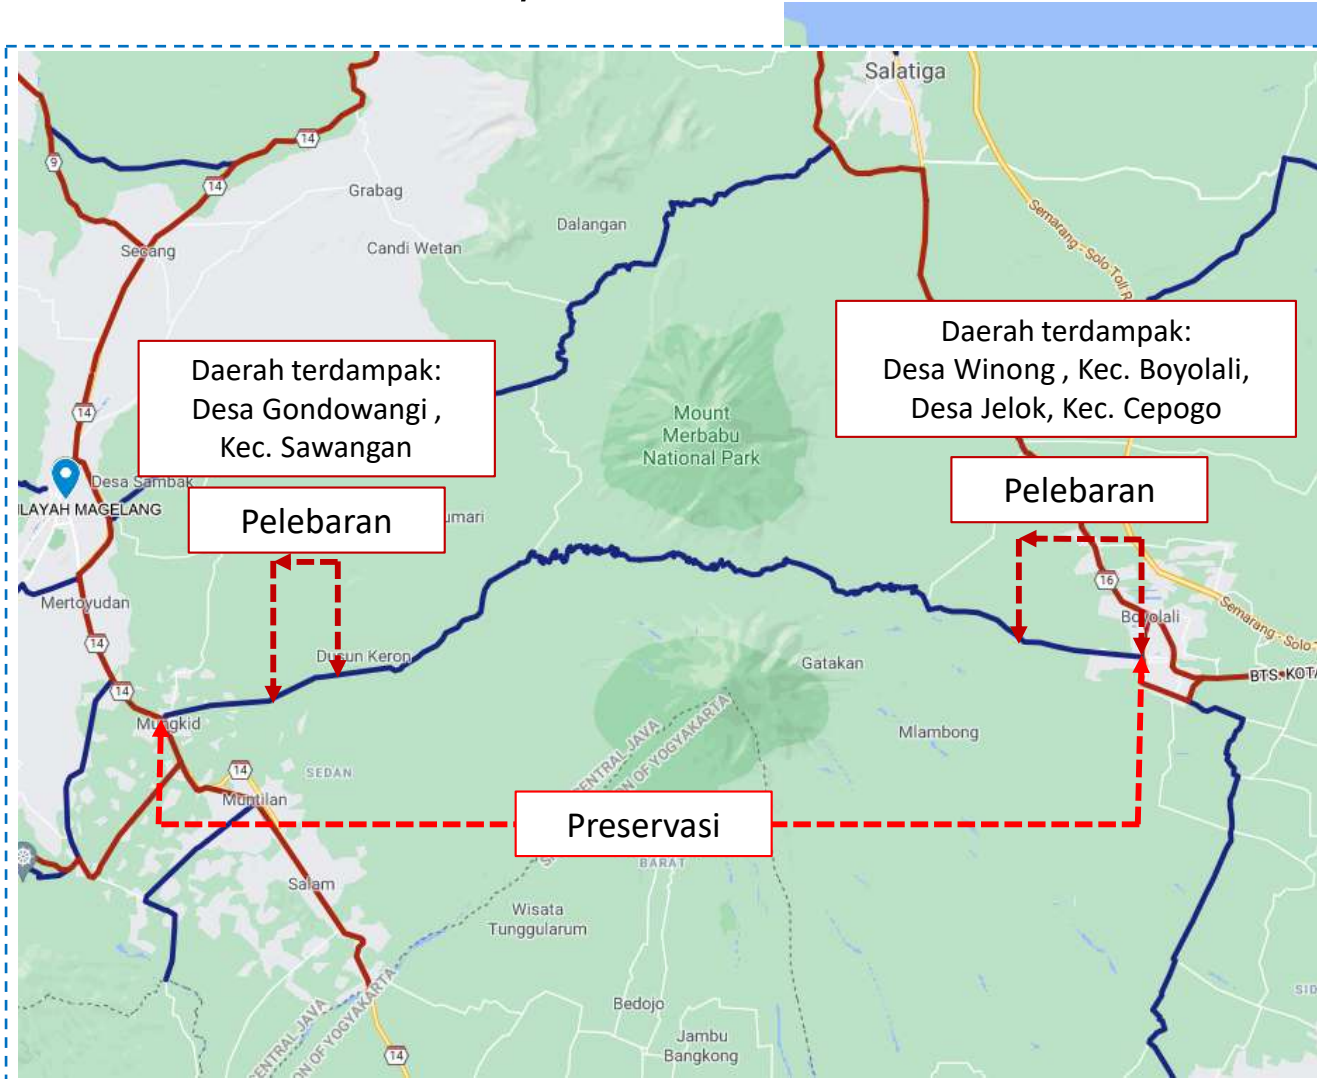

# PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

PELEBARAN

PRESERVASI



PROGRES per 17 Oktober 2021:

RENCANA : 97,900 %

REALISASI : 99,013 %

DEVIASI : 1,113 %

# WEBSITE JAWA TENGAH



**jatengprov.go.id**

PORTAL RESMI PROVINSI JAWA TENGAH



## WebGIS Jalan

Geographic Information System data spasial jalan di Jawa Tengah.

👉 Kunjungi halaman



## Jalan Cantik

Aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

👉 Kunjungi halaman



## Cuitan Twitter

Sampaikan saran Anda dengan singkat dan sopan, menuju Jateng Sejahtera

👉 Buka Twitter



## PPID Pembantu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas PU Binmarcipka

👉 Kunjungi halaman



## Silakon

Laboratorium Pengujian BP2 Provinsi Jawa Tengah

👉 Kunjungi halaman

